


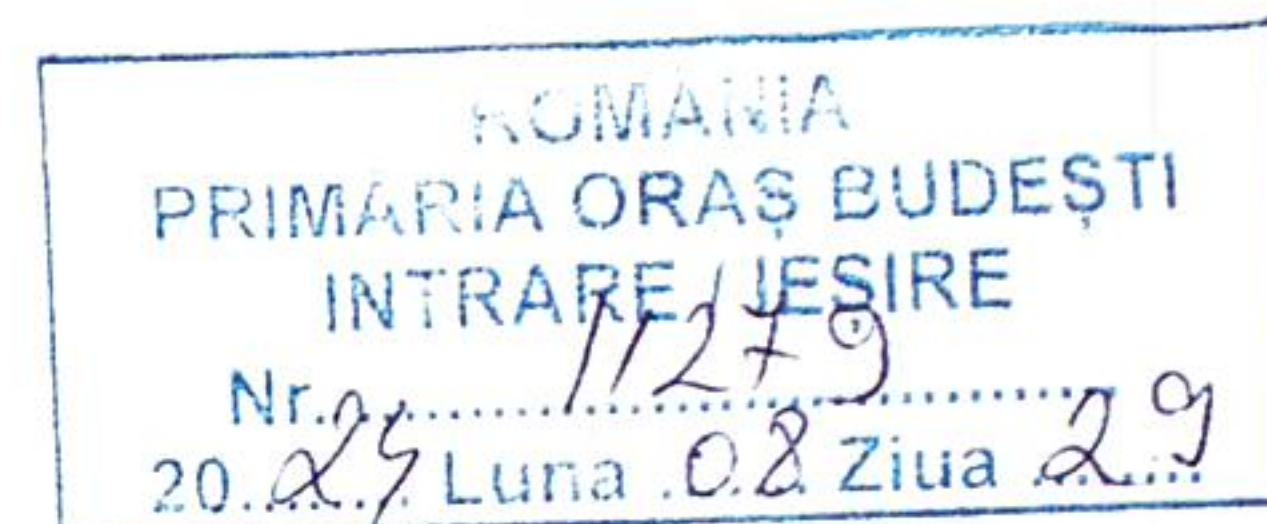

NOTA DE CONSTATARE
Nr. 1/ 11.07.2024

Referitor contract EFICIENTIZARII ENERGETICE A CLADIRII SCOLII GIMNAZIALE "GHEORGHE MANU" BUDESTI

Participa :

Constructor

SC QUADRANT ENGINEERING SRL – Sef Santier – DI. SORA CLAUDIU

Beneficiar

ORAS BUDESTI – Diriginte santier Specialitatea Constructii – dl Rotaru Ion
Diriginte santier Specialitatea Instalatii – dl Tutuieanu Ion

Proiectant

SC JOYZABLE SRL – Administrator- VLADIMIR CONSTANTIN CRISAN

In urma intalnirii cu ocazia efectuării predării-primirii de amplasament s-au constatat următoarele :

Capitolul REZISTENTA

- In listele de cantitati , al art.1RPCH06C01-Corpurile 1 si 2 -Substructura dulapi din lemn 5x20 cm la partea superioara a planseului este prevazuta cantitatea de 16.20 mc de material, insa in componenta articolului nu este prevazuta decat o cantitate de 5.67 mc (vezi art 001 cod material 2904169) , rezultand o diferenta necesara de material de 10.53 mc.

Capitolul ARHITECTURA

- In listele de cantitati ,la articolul 015-CE17A01 INVELITOARE -suprafata 939.000 mp este prevazut ca si cod de material 2000994 – Tabla faltuita , desi atat sistemul de scurgere al apelor pluviale care este din tabla tip Lindab (vezi art.020-CE08A01- Jgheaburi si burlane de tip WETTERBEST pentru acoperisuri) cat si sistemul de prindere al tablei pe sipci si contrasipci (vezi art 017-CE10A01-Montarea sistemului de sipci si contrasipci la sistemele de invelitori) indica tipul de tabla ca fiind de tip Lindab
- Este prevazuta demontarea tamplariei existente in suprafata de 304.90 mp si montarea unei tamplarii noi. Din constatările facute in teren si din parcurgerea listelor de cantitati se constata lipsa modalitatii de refacere a spalierilor din jurul ferestrelor, partea interioara, lipsa elementelor de liniaritate, in speta coltare din aluminiu cu plasa , materialul de lipire si de finisare.
Cantitatea de 873.10 mp aferenta articolului CF12A01*-Interior-tencuiala si glet la pereti din zidarie la interior si cantitatea de 871.60 mp aferenta articolului CN01A*- Interior-Vopsitorie lavabila si amorsa vor fi folosite la reparatiile ce se vor face in zona adiacenta montarii ferestrelor deoarece, avand in vedere stadiul existent al peretilor la ora actuala-decadari,causiri,burdusiri-la momentul desfacerii tamplariei vor exista zone extinse ce vor necesita reparatii .

Asupra situatiei existente a peretilor si tavanelor din scoala, atat la parter cat si la etaje , atragem atentia ca NU sunt prevazute cantitati de refaceri pariale si zugraveli totale, aferente intregii suprafete existente de pereti si tavane, ce prezinta vizibile degradari, rezultatul final al unor lucrari executate asa cum sunt prevazute in proiect nefiind cel scontat, respectiv un aspect ambiental placut vederii.

Capitolul **INSTALATII ELECTRICE-SCOALA**

-Asa cum este descris in memoriul tehnic aferent instalatiilor electrice , cablurile de current vor fi introduce printr-un tub de protectie flexibil in lungime de 4329.00 ml (vezi articol 013-EA10B#) , 1105 ml vezi art 044-EA02B04 si 195 ml -vezi articol 045-EA01B03 ce se va monta ingropat in zidarie.

In acest sens a fost prevazuta la art 020 PJ11A1 din listele de cantitati desfacerea tencuielii existente ,inclusiv curatarea fatadelor zidariei pe o suprafata de 1064.96mp corelata cu dimensiunea tubului care este DN100 , a se vedea art.013-Cod material 6704661-Tub riflat neperforat PVC DN 100.

Din studierea listelor de cantitati de la capitolul Arhitectura precum si cele de la Instalatii electrice ,am constatat **lipsa cantitatilor de refacere a zonelor ce se vor desface**, respectiv suprafata de 1064.96 mp.

Nu sunt prevazute urmatoarele cantitati:

- CF12A01*-Interior-tencuiala si glet la pereti din zidarie la interior – 1064.96 mp
- CN01A*-Interior-Vopsitorie lavabila si amorsa – 1064.96 mp

-In cadrul Memoriului tehnic de instalatii este prevazut la capitolul 6.11 instalatii panouri fotovoltaice se prevede ca , panourile fotovoltaice se vor amplasa pe invelitoarea imobilului. Din consultarea planselor puse la dispozitie , NU am regasit detalii de prindere a acestor panouri pe invelitoarea imobilului precum si detalii de hidroizolare a punctelor de prindere in vederea evitarii infiltratiilor de apa meteorica pe langa gaurile de prindere.

Capitolul **INSTALATII HVAC-SCOALA**

- In cadrul Memoriului tehnic Instalatii HVAC ,pag 7 se prevad urmatoarele:
 - *Distributia agentului termic in incaperi se va realiza prin conducte din Pe-Xa montate direct pe placa de beton si sunt acoperite cu sape de ciment.*
 - Si
 - *Pentru conductele montate in sapa nu se vor admite imbinari,ele vor fi continue intre distribuitor/colector si radiatoare si vor fi montate in tuburi flexibile de protectie.*

-In listele de cantitati , sunt prevazute a se utiliza urmatoarul tip de material - Teava constructii fara sudura laminate la cald , cu urmatoarele dimensiuni: 25x3/OLT 35S , 57x3.5/OLT 35S , 28x3.5/OLT 35S, 32x3/OLT 35S, 34x3/OLT 35S, 57x4/OLT 35S, 60X6/OLT 35S , 89X5/OLT 35S , in totala contradictie cu conducta de Pe-Xa prevazuta in cadrul proiectului tehnic

- Deasemenea , in listele de cantitati nu sunt urmatoarele:

- * lipsa tuburi flexibile de protectie asa cum este prevazut in PTh
- * nu este prevazuta operatiunea de desfacere a pardoselilor existente (parchet laminat si mozaic) pentru realizarea traseului si introducerea conductelor
- * nu este prevazuta cantitatea necesara de sapa ce se va turna in grosime de 5cm peste conductele ce se vor monta ingropat
- * Nu este prevazuta operatiunea de spalare a tevilor si operatiunea de efectuare a probelor de etanseitate a tevilor si a probelor de presiune asa cum prevede legislatia in vigoare.
- * facem mentiunea, FOARTE IMPORTANTA , ca in zona claselor , unde exista acum pardoseala din parchet lamellar ce este degradat , este imposibila realizarea montajului conductelor prin taierea partiala sau scoaterea totala a parchetului lamellar, deoarece acesta nu mai poate fi remontat.

Zona afectata de introducerea conductelor se situeaza in jurul cifrei de 1377.00 ml, aproximativ 344.25 mp

Fata de cele constatate, solicitam proiectantului elaborarea solutiilor tehnice necesare, intocmirea unui Memoriu tehnic (justificativ), a Dispozitiei de santier, listelor de cantitati NR/NCS pentru corelarea documentatiei de executie cu situatia reala din teren

Executant
SC QUADRANT

Sef santier -SORA CLAUDIU



Diriginti de santier

Constructii

Instalatii

Ing. Rotaru Ion

Ing. Tutuieanu Ion





DISPOZIȚIE DE ȘANTIER		
	Nr.	Data
	DS_01-JOY58-3/2023	12.09.2024
	☐ Necesită modificarea planurilor și/sau detaliilor de execuție;	
	☒ Necesită modificarea specificațiilor tehnice;	
	☒ Necesită modificări ale documentației economice (antemăsurători, NCS, NR);	
VERIFICAT TEHNIC	☐ Piese desenate anexate;	
MOTIVUL EMITERII	Solicitarea beneficiarului	
SOLICITANT	U.A.T. ORAS BUDESTI	
CATEGORIA DE LUCRĂRI	Adaptarea măsurilor prevăzute în documentația tehnică recepționată	
NUME	SEMNĂTURA	
EMITENT S.C. JOYZABLE S.R.L.		
REPREZENTANT BENEFICIAR	Am luat la cunoștință de modificările aduse documentației tehnice recepționate, prin prezenta dispoziție de șantier și sunt de acord cu implementarea lor	
Notă: Dispoziția de șantier devine operantă odată cu semnarea acesteia de către reprezentantul legal al beneficiarului.		

Referitor la adresa nr 1 / 11.07.2024, emisă de SC QUADRANT ENGINEERING SRL și însoțită de Beneficiar prin Dirigintele de Șantier Ion ROTARU, respectiv Ion TUTUIEANU, din cadrul proiectului "Eficientizare energetica a cladirii Scolii Gimnaziale "Gheroghe Manu", Budești", prin prezenta dispoziție de șantier, dispunem și explicităm următoarele aspecte și/sau modificări:

Nr. PROIECT
JOY58-3

DENUMIRE
Dispoziție de șantier

COD
DS_01- JOY58-3/2023

DATA
09.2024

AUTOR
Ing. Vladimir CRIȘAN

1. Specialitatea Rezistență

- 1.1. In lista de cantitati, in componenta articolului 1RPCH06C01, cantitatea corecta de material cu codul 2904169 este de 16.20mc. Se poate proceda la suplimentarea materialului cu cod 2904169, cu cantitatea de 10.53mc.

2. Specialitatea Arhitectură

- 2.1. Prin „ÎNVELITOARE TABLĂ FĂLȚUITĂ” se poate intelege atat tabla faltuita la fata locului, in sistem clasic, sau tabla prefaltuita de fabrica. Atat listele de cantitati, cat si detaliile de executie au fost realizate pentru invelitoare de tip tabla prefaltuita, care se regaseste sub diferite denumiri comerciale (Tabla faltuita click, Tabla faltuita Faltz, Tabla Faltuita, Tabla cu falt simplu (click) etc). Suntem de acord cu înlocuirea materialului de invelitoare cu un material similar, dar care prezinta o alcătuire ventilata, cu respectarea condițiilor de montaj ale producătorului.

- 2.2. Prin listele de cantitati au fost acoperite reparatiile in zonele de interventie atat din zona tamplariei cat si in restul zonelor peretilor, prin doua articole CF12A01* - Tencuiala din mortare predozate uscate, executata manual in strat unic, pe suprafete interioare din zidarie de caramida, pe baza de var-ciment-tencuiala MPI 25 si glet de perete INTERIOR - TENCUIALA SI GLET LA PERETI DIN ZIDARIE LA INTERIOR, CD15B - ANVELOPANTĂ - PROFIL PENTRU JONCTIUNEA CU ELEMENTELE DE TÂMPLĂRIE.

Conform prevederilor ordinului Nr. 1568 din 15.10.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice și anume: "2.2.2. Executanții (ofertanții) au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor."

Retetele tuturor articolelor din listele de cantități vor fi realizate de către fiecare ofertant în parte în momentul elaborării ofertei financiare, cu respectarea articolelor prevăzute în documentația economică și cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor.

Referitor la articolul CN01A* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si un strat vopsea lavabila de interior, cu aplicare pe suprafete interioare noi, puțin absorbante INTERIOR - VOPSITORIE LAVABILA ȘI AMORSĂ, a existat o greșeala de transcriere între lista de cantități transmisă de proiectat și programul de devize. Cantitatea estimativă conform datelor din proiect pentru acest capitol fiind de 8716,00 mp în loc de 871,60mp. Aceasta suprafață acoperind, din calculele noastre, zăgrăvelile totale a întregii suprafețe existente de pereti și tavane ale obiectivului.

Revenind la întrebarea de la punctul B, da se dorește operațiuni de reparații locale acolo unde este cazul și de vopsitorii cu vopsea lavabila pe întreaga suprafață a interiorului scoli, respectiv pereti și tavane, atât la parter cât și la etajele superioare.

Referitor la punctul C, răspunsul se regăsește mai sus.

- 2.3. Referitor la articolul IZF12B04 din Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, se îndreaptă eroarea materială de transcriere din „ANVELOPANTA TERMOSISTEM VATA MINERALA 10CM, INCLUSIV MORTAR PENTRU LIPIREA PLĂCILOR TERMOIZOLANTE,

Nr. PROIECT	DENUMIRE	COD
JOY58-3	Dispoziție de șantier	DS_01- JOY58-3/2023

DATA
09.2024

AUTOR

Ing. Vladimir CRISAN



MORTAR PENTRU SPACLUIREA PLACILOR, DIPLURI, STRAT DE ARMARE, GRUND DE AMORSAJ SI TENCUIALA DECORATIVA SI VOPSITORIE LAVABILA” în „ANVELOPANTA TERMOSISTEM VATA MINERALA 15CM, INCLUSIV MORTAR PENTRU LIPIREA PLACILOR TERMOIZOLANTE, MORTAR PENTRU SPACLUIREA PLACILOR, DIPLURI, STRAT DE ARMARE, GRUND DE AMORSAJ SI TENCUIALA DECORATIVA SI VOPSITORIE LAVABILA”, implicit articolul „600001057 - Placa din vata minerala bazaltica Knauf Insulation FKD-N Thermal, cu conductivitatea termica de 0,034 W/mK, de dimensiuni 1000x600x100 mm, pentru termoizolarea fatadelor de contact” în „600001057 - Placa din vata minerala bazaltica Knauf Insulation FKD-N Thermal, cu conductivitatea termica de 0,034 W/mK, de dimensiuni 1000x600x150 mm, pentru termoizolarea fatadelor de contact”.

- 2.4. Referitor la articolul CF09A01 din Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, se îndreaptă eroarea materială de transcriere din „Sistem exterior termoizolant la suprafețe verticale în contact cu solul cu polistiren extrudat în grosime de 10 cm - FUNDAȚII - TERMOIZOLAȚIE POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM” în „Sistem exterior termoizolant la suprafețe verticale în contact cu solul cu polistiren extrudat în grosime de 15 cm - FUNDAȚII - TERMOIZOLAȚIE POLISTIREN EXTRUDAT 15 CM”, implicit articolul „500002579 - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu cu dimensiunile 120 x 65 x 10 cm” în „500002579 - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu cu dimensiunile 120 x 65 x 15 cm”.

3. Specialitatea Instalații Electrice

- 3.1. Suntem de acord cu suplimentarea de suprafață a articolului CF12A01 *-Interior-tencuiala si glet la pereti din zidarie la interior cu o suprafață de 1064.96 mp pentru refacerea zonelor afectate de interventii.

Conform răspunsului din capitolul arhitectura legat de articolul CN01A* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si un strat vopsea lavabila de interior, cu aplicare pe suprafețe interioare noi, puțin absorbante INTERIOR - VOPSITORIE LAVABILA ȘI AMORSĂ, după îndreptarea erorii suprafeței de intervenție nu ar mai fi necesara suplimentarea acestuia cu 1064.96mp. Suprafața rezultata în urma corectării acoperind întreaga suprafața a ainteriorului scolii, respectiv pereti si tavane, atat la parter cat si la etajele superioare.

- 3.2. Detaliile de executie pot fi de 3 tipuri:

- a) detalii de executie privind solutionarile elaborate de proiectant;
- b) detalii de executie pentru echiparea obiectivului de investitii, în timpul executiei, cu aparatura si echipamente, realizate cu respectarea datelor si informatiilor oferite de către furnizorii acestora;
- c) detalii de executie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de subansamble) sau detalii de executie care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de regula, de catre firma de constructii.

Tinand cont ca Sistemul de panouri fotovoltaice este un echipament, iar atat profilele de montaj cat si panourile sunt particularizate în functie de producator, detaliile de prindere a panourilor cat si a accesoriilor de montaj sunt detalii oferite de catre furnizor sau producator.

Nr. PROIECT	DENUMIRE	COD	DATA	AUTOR
JOY58-3	Dispoziție de șantier	DS_01- JOY58-3/2023	09.2024	Ing. Vladimir CRIȘAN

6

4. Specialitatea Instalații HVAC

- 4.1. Referitor la modul de distribuție a agentului termic, este o eroare în descrierea distribuției din memoriul tehnic, distribuția se realizează cu teava de OTEL pe la plafon, conform listelor de cantități și a planselor tehnice. O să revizuiesc paragraful din memoriul tehnic.
- 4.2. Distribuția agentului termic se realizează cu teava de OL pe la plafon, nu sunt necesare tuburile flexibile.
- 4.3. Distribuția agentului termic se realizează pe la plafon, în acest sens nu este necesară desfacerea pardoselilor existente.
- 4.4. Distribuția agentului termic se realizează pe la plafon, în acest sens nu este necesară șapă.
- 4.5. Distribuția agentului termic se realizează pe la plafon, în acest sens nu este necesară desfacerea pardoselilor existente.

5. Specialitatea Instalații Sanitare

- 5.1. Referitor la listele de cantități aferente zonelor de grupuri sanitare avem următoarele articole:
IZF30A01^ - Aplicarea hidroizolației de tip Adeplast MH 1K monocomponentă, prealabil plăcilor ceramice sau celor cu piatră naturală - INTERIOR - HIDROIZOLAȚII INTERIOARE ÎN BAI
CG06A01^ - Sistem de placare ceramică realizat cu mortar adeziv Adeplast AF-E, mortar Adeplast Qk-7 și șapă Adeplast Top 1, pentru exterior INTERIOR - PARDOSEALA DIN GRESIE, INCLUSIV STRAT SUPT
CI01A04> - Placaj faianță - INTERIOR - PLACARI CERAMICE PERETI, INCLUSIV STRAT SUPT
RPCT20C1 - DESFACERI - FINISAJE PARDOSEALA PLACI CERAMICE
RPCT20C1b - DESFACERI - FINISAJE PERETI PLACI CERAMICE
Cantitățile, din aceste capitole ar trebui să acopere atât desfacerea integrală a plăcilor ceramice din bai atât la pereti cât și la pardoseli.

Conform **articolului 67, alin. 2** din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții:

Prin excepție de la prevederile alin. (1), pe bază de dispoziție de șantier dată de proiectantul lucrărilor și verificată de către un verficator de proiecte atestat în condițiile legii, precum și cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/ administratorului/managerului de proiect, după caz, se pot admite modificări locale ale soluțiilor tehnice din documentația tehnică - D.T. autorizată fără emiterea unei noi autorizații de construire, dacă:

- a) nu se modifică funcțiunea consemnată în autorizația inițială;
- b) se asigură respectarea prevederilor avizelor/acordurilor/punctului de vedere al autorității competente pentru protecția mediului, precum și ale actului administrativ al acesteia după caz, anexe la autorizația inițială;
- c) se asigură respectarea prevederilor Codului civil;
- d) nu se modifică condițiile de amplasament (regim de înălțime, POT, CUT, aliniament, distanțele minime față de limitele proprietății, ori aspectul construcției);
- e) nu sunt periclitate rezistența și stabilitatea clădirilor învecinate;

Nr. PROIECT	DENUMIRE	COD	DATA	AUTOR
JOY58-3	Dispoziție de șantier	DS_01- JOY58-3/2023	09.2024	Ing. Vladimir CRIȘAN

- f) se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securității la incendiu.
g) se asigură economia de energie.

Prezentei dispoziții de șantier nu îi sunt anexate alte documente.

S.C. JOYZABLE S.R.L.

Ing. Vladimir CRIȘAN



S.C. ARHITECTONIC DESIGN STUDIO S.R.L.


Arh. Rareș Marian CRISTU



S.C. INSTAPROJECTS S.R.L.

Ing. Alin MUSTAȚĂ

Ing. Rareș ENEA

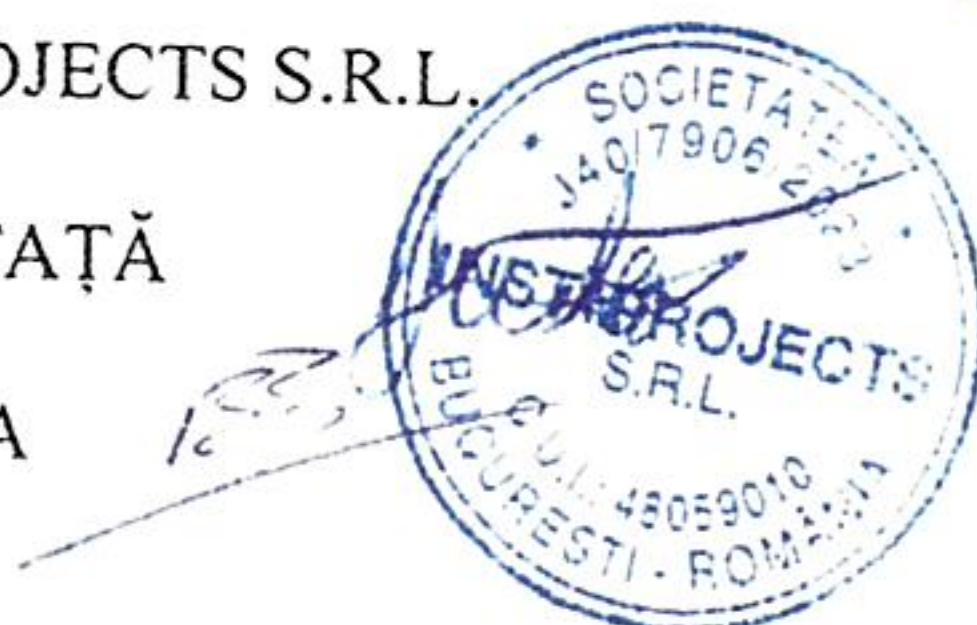

Diriginte de șantier

ROTARU ION



Executant

SC QUADRANT

ENGINEERING

SRL

Diriginte de șantier

TUTUIEANU ION

BENEFICIAR

U.A.T. ORAS BUDESTI

Primar ILIE MIHAI



Nr. PROIECT
JOY58-3

DENUMIRE
Dispoziție de șantier

COD
DS_01- JOY58-3/2023

DATA
09.2024

AUTOR
Ing. Vladimir CRIȘAN

Achiziții Publice Primăria orașului budești

From: Quadrant Enginnering <quadrantenginnering@gmail.com>
Sent: 09 October 2024 14:27
To: achizitii@primariebudesti.ro
Subject: Nota de comanda suplimentara si nota de renuntare - Oferta financiara
Attachments: BUDESTI NCS NR.pdf

Buna ziua,

Retransmitem in urma emiterii Dispozitiei de santier, oferta financiara cu privire la Nota de comanda suplimentara si Nota de renuntare, insotita si de ofertele de materiale primite.

Va rugam sa ne confirmati primirea prezentului email si un numar de inregistrare daca este posibil.

Cu stima,
SC QUADRANT ENGINEERING SRL



Obiectiv :
2024-REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA ORAS BUDESTI, JUD CALARASI

Centralizatorul cheltuielilor NCS si NR

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA	
	REZISTENTA	15284.19
	ARHITECTURA	637008.91
	NOTA DE RENUNTARE	
	ARHITECTURA	-250744.09
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		401549.01
Taxa pe valoarea adaugata		76294.31
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		477843.32

Executant
SC QUADRANT ENGINEERING SRL lider al asocierii SC QUADRANT ENGINEERING
SRL-SC SINVEX-MULSERVICE SRL



Primăria Oraşului Budeşti

Nr. 16083 / 11.11.2024

APROB

PRIMARUL ORĂSULUI BUDESTI

ILIE MIHAI

PROCES VERBAL

de verificare a ofertelor prezentate de SC QUADRANT ENGINEERING SRL

Incheiat azi, 12.11.2024, de catre noi, comisia nominalizata prin Dispozitia Primarului orasului Budesti nr. 330/09.10.2024, compusa din:

- Diaconu Laurentiu-Romulus – presedinte cu drept de vot,
- Bilciu Alexandru – membru,
- Cismas Liviu – membru.

Comisia a analizat oferta nr. 14048/09.10.2024 prezentata de SC QUADRANT ENGINEERING SRL conform Dispozitiei de santier DS-01-JOY58-3/2023/12.09.2024.

In urma analizei au rezultat urmatoarele:

- Oferta respecta cantitatile prevazute de proiectant in Dispozitia de santier DS-01-JOY58-3/2023/12.09.2024.
- Pentru produsele ofertate initial (in oferta prezentata in cadrul procedurii de achizitie) au fost ofertate aceleasi preturi.
- Pentru produsele nou introduse in listele de cantitati aferente Dispozitiei de santier DS-01-JOY58-3/2023/12.09.2024 – *polistiren extrudat 125x60x15 cm si vata minerala bazaltica tip knauf 15 cm* – executantul a prezentat trei oferte de pret.

Din analiza acestora a rezultat faptul ca a fost selectata oferta de pret cea mai mica. Deasemenea, este de mentionat faptul ca ofertele de pret au fost obtinute de la furnizori mari de pe piata de specialitate – Dedeman, Leroy Merlin si Sc Geomil Infrastructura SRL.

Avand in vedere cele de mai sus, comisia considera ca oferta prezentata poate fi acceptata in vederea suplimentarii cantitatilor de lucrari si majorarii valorii contractului.

Comisia de evaluare

Presedinte cu drept de vot

Diaconu Laurentiu-Romulus

Membri

Bilciu Alexandru

Cismas Liviu
