

Dispozitie de santier Nr. 001/28.06.2024 SANTIER Grosi

Obiectiv investitie: „Infiintare retea de canalizare in localitatea Grosi, comuna Grosi, judetul Maramures”
Cod Proiect: XT139/2023
Amplasament: comuna Grosi, jud. Maramures
Beneficiar: Comuna Grosi
Proiectant: SC XALLO TEHNIC SRL
Executant: SC AMI S.A.

Informatii care fondeaza emiterea dispozitiei

Prezenta dispozitie de santier se emite in urma solicitarii beneficiarului, in stransa legatura cu indicatiile executantului si a dirigintelui de santier in cadrul sedintei, materializat prin procesul verbal de comandament nr. 4158 din 21.05.2024 si adresei nr. 4215/25.05.2024, cu scopul de a corela, optimiza situatiile aparute in perioada de executie a lucrarilor.

DISPUNEM:

- Se vor putea executa racorduri si direct in colectorul de canalizare cu respectarea legislatiei in vigoare, in acest sens se emite detaliu suplimentar, plansa D-11- Detaliu racordare in colector cu ramnificatie tip Y. Pozitiile in plan si solutiile de racord, in caminul de vizitare sau in direct in colector vor fi stabilite de catre executant in functie de pozitiile punctelor de racord la proprietati respectiv a retelei de canalizare. Au fost prevazute 225 racorduri in camine de vizitare respectiv 224 racorduri direct in colectorul de canalizare.
- Pentru caminele de rupere de panta se va respecta detaliul revizuit conform plansei D-05 rev1 Detaliu montaj camin de rupere de panta prefabricat din beton $\Phi 1000$.
Capacele si rama din fonta se pot monta, in functie de panta drumului, atat in pozitie concentrica cat si excentrica, detaliu suplimentar Plansa D-12 - Detaliu placa capac pentru camine de vizitare $\Phi 1000$
- Statii de pompare compacte, complet echipate, din material GRP se pot inlocui cu statii de pompare compacte, complet echipate, din material PEID cu respectarea parametrilor tehnici e functionare.
- Subtraversarea Vale Carburnareasa cu o lungime de 76m se transforma intr-o subtraversare de 20m a strazii Mihai Viteazu, respectiv osupratraversare a Vaii Carburnareasa prin legare de pod cu o lungime de 25m, conform plansei PS-03 rev1 Plan de situatie Grosi.

Documente care insotesc dispozitia de santier:

Plansa D-11 - Detaliu racordare in colector cu ramnificatie tip y

Plansa D-12 - Detaliu placa capac pentru camine de vizitare $\Phi 1000$

Plansa D-13 - Detaliu tip legare de pod, conducta PEID

XALLOTEHNIC

Plansa **D-05 rev1** - Detaliu montaj camin de rupere de panta prefabricat din beton Ø1000

Plansa **PS-03 rev1** - Plan de situatie Grosi

Proiectant, SC XALLO TEHNIC SRL
ing. Daniel Dorofteese

Executant, S.C. AMI S.A.

Beneficiar, Comuna Grosi

Diriginte de santier, Ing. Costin Dumitru Ioan


Verificator, Ing. Dan Calugaru




vedere in plan

NOTA:



Placa capac va fi din beton armat prefabricat respectand clasa de rezistenta D400 conform SR EN 1917:2003 cu element de etansare - garnitura EPDM - intre inel de aducere la cota sau con de reductie excentric

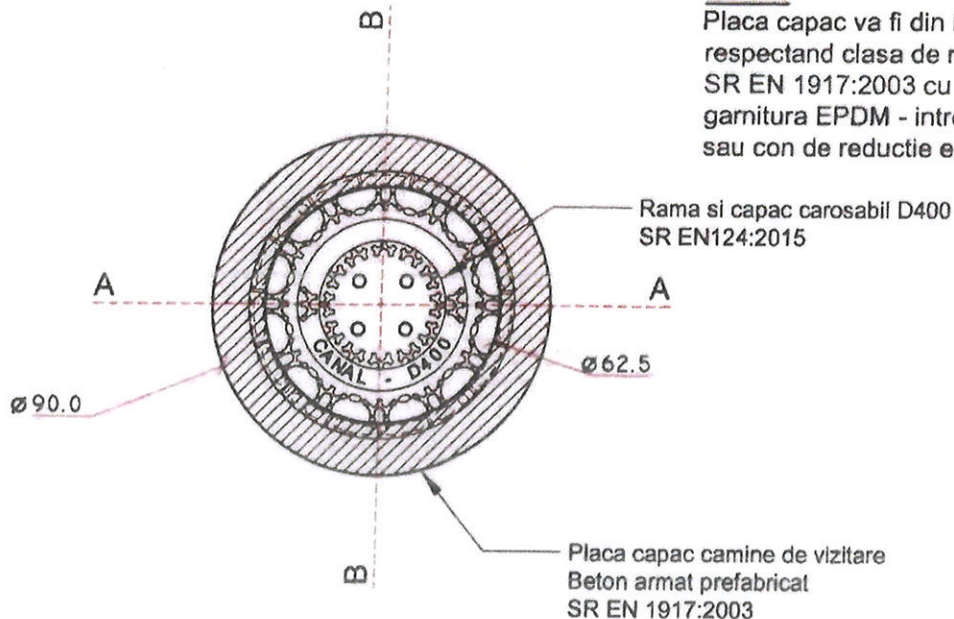


Sectioniunea A-A

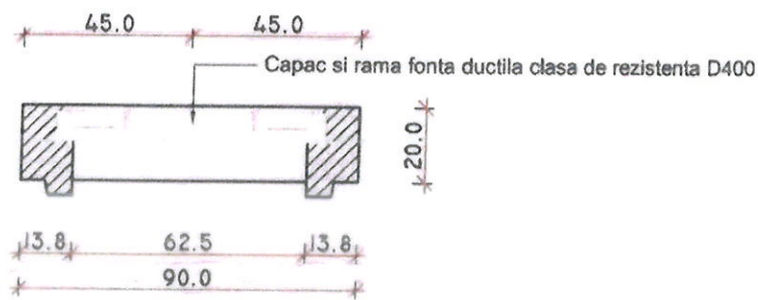

Sectioniunea B-B

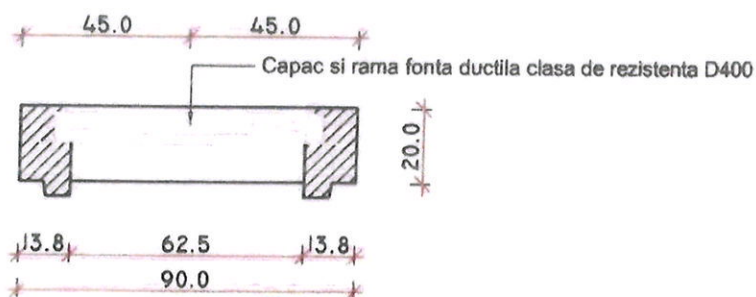

Verificator/ expert	Prenume/Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/expertiza nr./Data
Proiectant S.C. XALLO TEHNIC S.R.L. Str. Victor Babes nr. 15/4, Baia Mare, Maramures				"INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA GROSI, COMUNA GROSI, JUDETUL MARAMURES"
Specificatie Resp. proiect ing. Daniel Dorofteese Proiectat ing. Daniel Dorofteese Desenat ing. David Hepea				Pr. nr. XT 139/2021 Faza: PT Plansa D-12 Rev. 0
Data: Octombrie 2021 Beneficiar: COMUNA GROSI				Detaliu placa capac pentru caminele vizitare, Ø1000

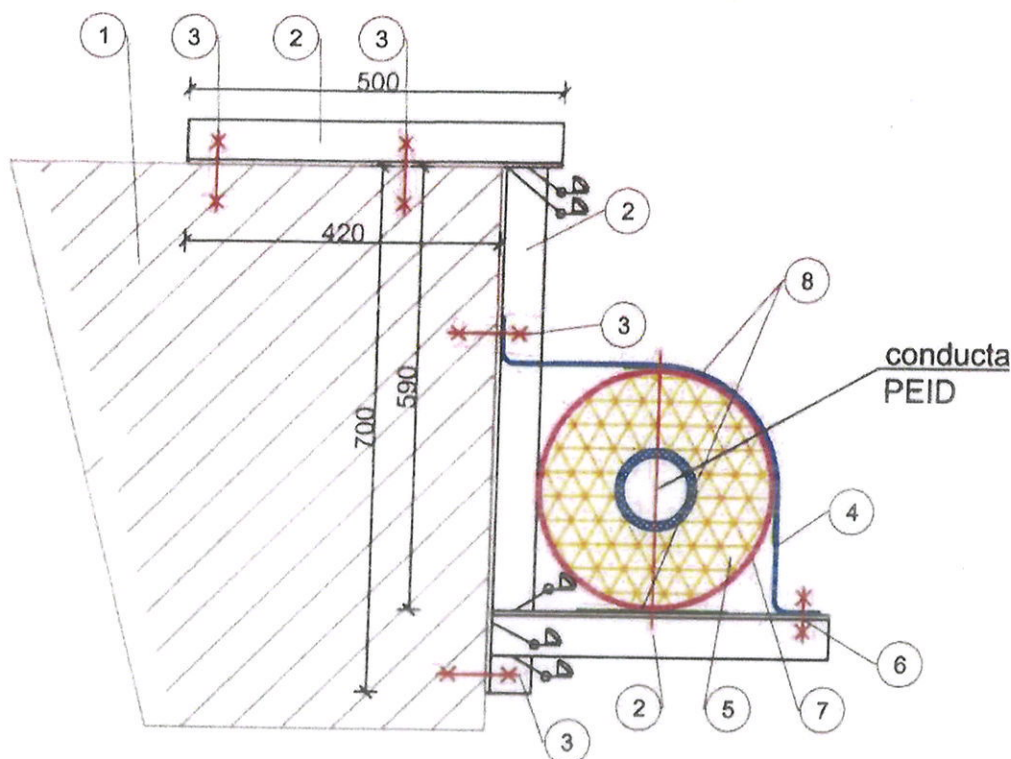


Poz.	Denumirea	Cant.	Material	Observatii
1	Structura pod			
2	Consola agatare pod	1 buc.	OL Zn, L60x60x6	L=1,55 m/buc.
3	Conexpand Ø12x120mm, saiba M12	4x1 buc.		
4	Colier prindere	1 buc.	Platbanda otel 25x4	L=0,80 m/buc.
5	Termoizolatie	1 mp		g=100 mm
6	Surub M10 x70, Piulita M10, 2 x saiba plata M10	1 buc.		
7	Tabla OL Zn, 0,4 mm	1 mp		
8	Garnitura cauciuc	0,5 m	banda cauciuc 30x3mm	


Tabel de componenta aferent unui metru de supratraversare.

Incadrarea in categoria de importanta:

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a HG nr. 766/1997, lucrarile proiectate sunt de categoria C de importanta (constructii de importanta normala).
- In conformitate cu STAS 4273-83, Tabelul 9, pentru localitati urbane, categoria lucrarilor hidrotehnice aferente alimentarii cu apa este 3, iar pentru canalizare 4 (alte localitati urbane).
- Din punct de vedere al duratei de exploatare, lucrarile propuse sunt definitive si principale, incadrandu-se conform tabelului 13 in clasa de importanta III pentru apa si IV pentru canalizare.
- In conformitate cu HG 925/1995, Exigentele de performanta sunt: Is




Verificator/ expert	Prenume/Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/expertiza nr./Data
Proiectant S.C. XALLO TEHNIC S.R.L. Str. Victor Babes nr. 15/4, Baia Mare, Maramures				
"INFIIINTARE RESEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA GROSU, COMUNA GROSU, JUDETUL MARAMURES"				Pr. nr. XT 139/2021
Specificatie	Nume	Semnatura	DETALIU TIP LEGARE DE POD, CONDUCTA PEID Beneficiar: COMUNA GROSU	
Resp. proiect	ing. Daniel Dorofteese			
Proiectat	ing. Daniel Dorofteese			
Desenat	ing. David Hepea			
			Data: Octombrie 2021	Faza: PT Plansa D-13 Rev. 0

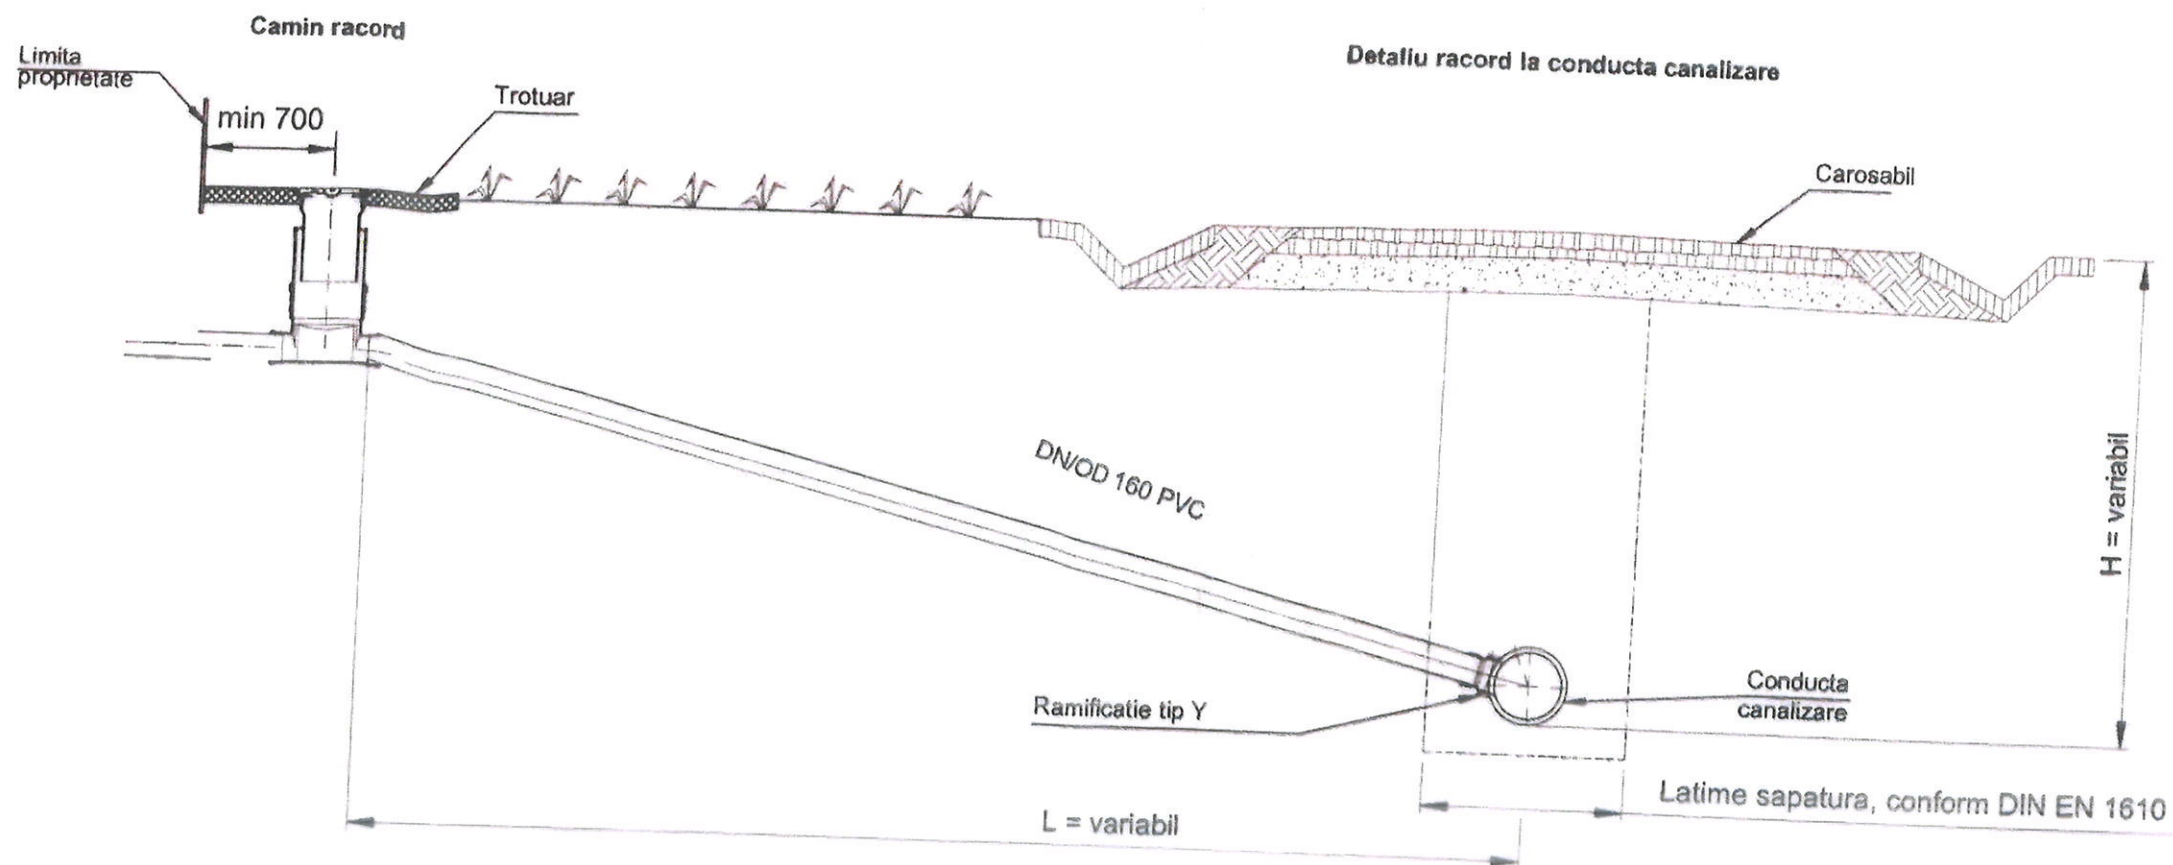

NOTA 1:

Adâncimea de pozare a conductei de racord va fi minim adâncimea de îngheț.
 Racordarea se va face până la limita de proprietate, pe spațiu public.
 La montarea caminului se va ține cont de caietele de sarcini și de recomandările producătorului.
 Fiecare racord va fi prevăzut cu camin de racord și dop înspre instalația de canalizare interioară a proprietății.
 Toate materialele și echipamentele vor fi montate conform recomandărilor producătorului.
 Între căminul de racord și colectorul stradal se realizează exclusiv tronsoane rectilinii
 (nu se admite instalarea de coturi pe traseul conductei de racord).
 În funcție de situația întâlnită în teren se vor combina tipurile de racordări prezentate, atât din punct de vedere al traseelor cât și a tipurilor de camin de racord.

Verificator/ expert	Prenume/Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/expertiza nr./Data
Proiectant S.C. XALLO TEHNIC S.R.L. Str. Victor Babes nr. 15/4, Baia Mare, Maramures				
"INFIIINTARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA GROSU, COMUNA GROSU, JUDEȚUL MARAMUREȘ"				Pr. nr. XT 139/2021
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Faza: PT
Resp. proiect	ing. Daniel Dorofteese	<i>[Signature]</i>	Data: Octombrie 2021	Plansa D-11
Proiectat	ing. Daniel Dorofteese	<i>[Signature]</i>		
Desenat	ing. David Hepea	<i>[Signature]</i>		

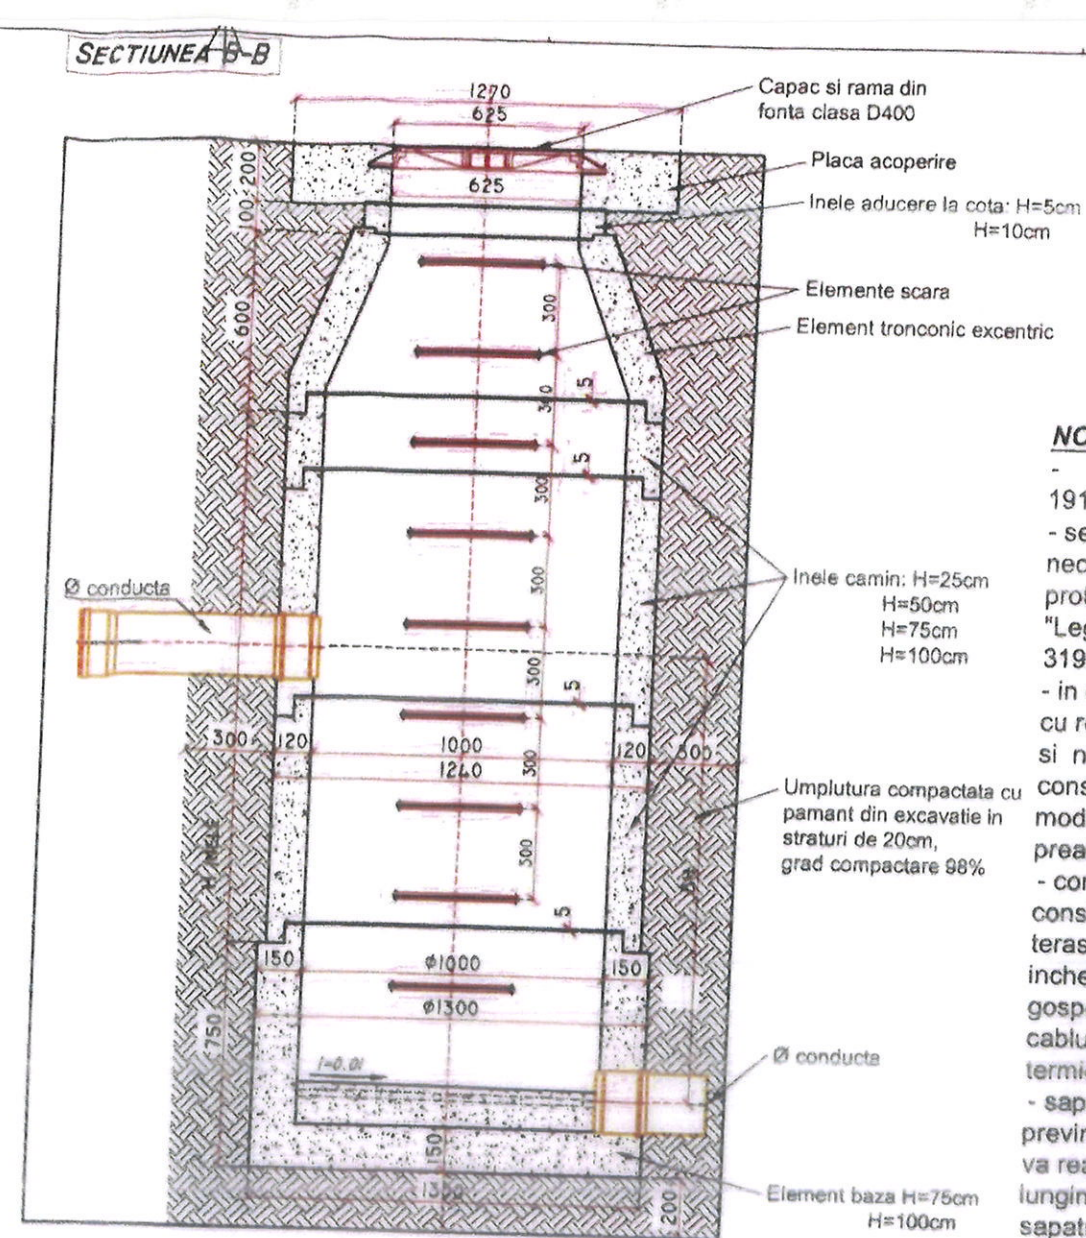

- Toate elementele vor respecta SR EN 1917:2003
- se atrage atentia in mod special asupra necesitatii respectarii "Regulamentului privind protectia si igiena muncii in constructii" si "Legea securitatii si sanatatii in munca" nr. 319/ 2006;
- in caz de intersectie a lucrarilor proiectate cu retele de gospodarie subterana existente si nesemnalizate in planul de situatie, constructorul si beneficiarul nu vor accepta modificarea traseelor fara a anunta in prealabil proiectantul lucrarii;
- conform dispozitiilor legale in vigoare constructorul va incepe executia lucrarilor de terasamente numai pe baza unui acord scris incheiat cu toate utilitatile care detin gospodarie subterana (cabluri electrice, cabluri telefonice, conducte de gaz, canale termice, cabluri R.A.T.T.);
- sapaturile vor fi astfel executate incat sa previna prabusirea peretilor, concomitent se va realiza si sprijinirea malurilor pe toata lungimea transeelor in cazul in care adancimea sapaturii depaseste 1.5m.



Clase si categorii de importanta

- In conformitate cu STAS 4273-83 Constructii hidrotehnice, Clasa de importanta IV, Categoria constructiei: 4
- In conformitate cu Legea 10/1995 si HG 766/1997, Categoria de importanta: "C- normala"
- Din punct de vedere al duratei de exploatare lucrarile propuse sunt definitive si secundare, incadrandu-se, conform tabel 13, in clasa de importanta IV
- In conformitate cu HG 925/1995, Exigentele de performanta sunt: Is

Vericator/expert		Prenume/Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/expertiza nr./Data	
Proiectant S.C. XALLO TEHNIC S.R.L. Str. Victor Babes nr. 15/4, Baia Mare, Maramures				"INFIINTARE REȚEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA GROSU, COMUNA GROSU, JUDETUL MARAMURES"		Pr. nr. XT 139/2021
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: %	Detaliu montaj camin de rupere de panta prefabricat din beton, Ø1000		Faza: PT
Resp. proiect	ing. Daniel Dorofteese		Data: Octombrie 2021			Plansa
Proiectat	ing. Daniel Dorofteese					D-05
Desenat	ing. David Hepea					Beneficiar: COMUNA GROSU
						Rev. 1

Obiectiv Infiintare retea canalizare in localitatea Grosi, com.Grosi, jud Maramures

Lista dispozitii de santier emise, actualizata la data :
03.02.2025

Nr. DS	Data	Specialitate	Obiect	Conținut	Evaluare financiara - valori cu TVA			
					Cod deviz	NCS-preturi contract	NCS- preturi noi	NR
1	28.06.2024	Canalizare	Retea canalizare gravitacionala	Racorduri	958002		-	714,091.95
	28.06.2024	Canalizare	Retea refulare	Subtraversare	958004	-	-	35,844.54
	28.06.2024	Canalizare	Retea refulare	Supratraversare Vale Carburnareasa	958113	51,870.76	-	
	28.06.2024	Canalizare	Retea canalizare gravitacionala	Racorduri	958114	694,398.71	-	
	28.06.2024	Canalizare	Retea canalizare gravitacionala	Supratraversare+Racorduri	958013	-	31,200.07	
						746,269.47	31,200.07	749,936.49
						746,269.47	31,200.07	749,936.49

Valoare contractului nr. 03/06.02.2024	14,097,534.62
Valoarea NCS preturi contract+NCS preturi noi	777,469.54
Valoarea NR contract nr. 3/06.02.2024	749,936.49



Obiectiv Iniintare retea canalizare in localitatea Grosi, com.Grosi, jud.Maramures

Lista dispozitii de santier emise, actualizata la data :
03.02.2025

Nr. DS	Data	Specialitate	Obiect	Conținut	Evaluare financiara - valori fara TVA			
					Cod deviz	NCS-preturi contract	NCS- preturi noi	NR
1	28.06.2024	Canalizare	Retea canalizare gravitationala	Racorduri	958002		-	600,077.27
	28.06.2024	Canalizare	Retea refulare	Subtraversare	958004	-	-	30,121.46
	28.06.2024	Canalizare	Retea refulare	Supratraversare Vale Carbunareasa	958113	43,588.87	-	
	28.06.2024	Canalizare	Retea canalizare gravitationala	Racorduri	958114	583,528.33	-	
	28.06.2024	Canalizare	Retea canalizare gravitationala	Supratraversare+Racorduri	958013	-	26,218.55	
						627,117.20	26,218.55	630,198.73
						627,117.20	26,218.55	630,198.73

Valoare contractului nr. 03/06.02.2024	14,097,534.62
Valoarea NCS preturi contract+NCS preturi noi	653,335.75
Valoarea NR contract nr. 3/06.02.2024	630,198.73

ROMANIA-M.D.R.T.-I.S.C.
COSTIN DUMITRU IOAN
DIRIGINT DE SANTIER
AUT. NR. 00020105: 00023522
DOMENII/SUBDOMENII:
1: 2.3: 3.1: 5.4: 6: 7

